MOLTO

	Nombre de la tarea	Duración	Inicio	Finalizar	Predecesoras
1	Implementación de CMS	10d	Junio 1, 2020	Junio 12, 2020	
2	Diseñador para refactorización de MOLTO-IT	10d	Junio 1, 2020	Junio 12, 2020	
3	Crear modelos de base de datos (Usuarios, misiones MOLTO-IT, slider, colaboradores, etc)	3d	Junio 15, 2020	Junio 17, 2020	1
4	Crear API para los distintos tipos de modelos de base de datos	1d	Junio 18, 2020	Junio 18, 2020	3
5	Implementación de nuevo diseño	5d	Junio 19, 2020	Junio 25, 2020	4
6	Evaluación 1er Periodo	5d	Junio 29, 2020	Julio 3, 2020	
7	Implementar conexión de MOLTO-IT UI con nueva API	3d	Junio 26, 2020	Junio 30, 2020	5
8	Crear un contenedor de docker para la API y el Sitio	3d	Julio 1, 2020	Julio 3, 2020	7
9	Crear tour con explicación de MOLTO-IT	4d	Julio 6, 2020	Julio 9, 2020	8
10	Crear nueva vista donde los usuarios puedan seleccionar entre crear una nueva misión o resumir una con un código que la aplicación envia al usuario al terminar de configurar la misión	1d	Julio 10, 2020	Julio 10, 2020	9
11	Crear servicio de email	2d	Julio 13, 2020	Julio 14, 2020	10
12	Optimizar vista responsive cuando se crean nuevas misiones en MOLTO-IT	1d	Julio 15, 2020	Julio 15, 2020	11
13	Modificar la información mostrada en MOLTO (Slider, colaboradores, etc) mediante CMS	1d	Julio 16, 2020	Julio 16, 2020	12
14	Desarrollo de definición de misión en modo avanzado.	1d	Julio 17, 2020	Julio 17, 2020	13
15	-Desarrollar implementación de spice?-	5d	Julio 20, 2020	Julio 24, 2020	14
16	Implementación de carga de cambios en producción mediante CI/CD en github.	1d	Julio 27, 2020	Julio 27, 2020	15
17	Evaluación 2do Periodo	5d	Julio 27, 2020	Julio 31, 2020	
18	Conseguir contacto de quien maneja dominios de UC3M	6d	Julio 20, 2020	Julio 27, 2020	
19	Usar dominios de UC3M para API y para UI	1d	Julio 28, 2020	Julio 28, 2020	16
20	Optimización de respuesta de algoritmo genético desde Matlab	4d	Julio 29, 2020	Agosto 3, 2020	19
21	Optimización de manejo de errores de Matlab en python	4d	Agosto 4, 2020	Agosto 7, 2020	20
22	Terminar documentación de API en producción	3d	Agosto 10, 2020	Agosto 12, 2020	21
23	Arquitectura de implementación de MOLTO-3BP (Opcional)	1d	Agosto 13, 2020	Agosto 13, 2020	22
24	Optimización de sitio web (UI) mediante animaciones	3d	Agosto 14, 2020	Agosto 18, 2020	23
25	Crear toy problems para MOLTO-IT	2d	Agosto 19, 2020	Agosto 20, 2020	24
26	Implementación de toy problems en MOLTO-IT	2d	Agosto 21, 2020	Agosto 24, 2020	25
27	Desplegar MOLTO-IT API y UI a producción	4d	Agosto 25, 2020	Agosto 28, 2020	26
28	3er y último periodo de Evaluación	6d	Agosto 24, 2020	Agosto 31, 2020	

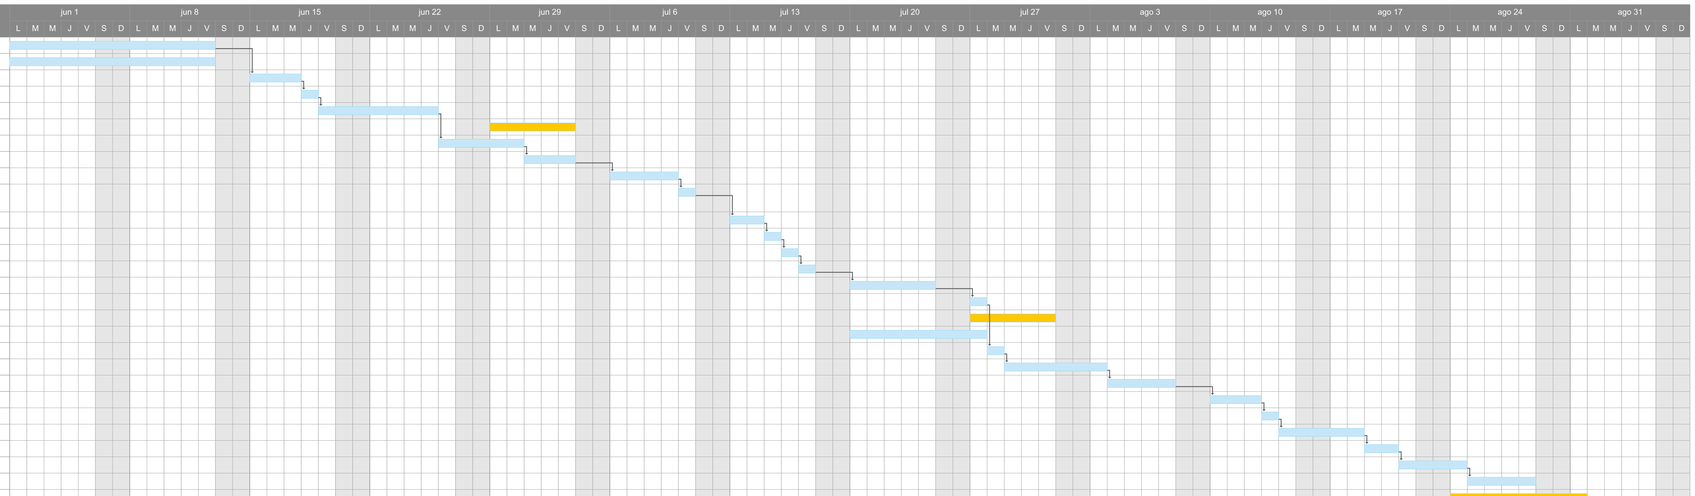

hipdf
